



原。柏形

chantilly

CONTENTS 目錄

01

工程概述

02

工程架構

03

公司組織架構


04

案件規劃流程

05

完工照




- 專案名稱： 
- 專案地點： 台北市中山區
- 專案類型： 單層住宅
- 業主： 朱公館
- 工程總金額： 約1800萬
- 工程面積： 264 m²/80坪
- 施工內容： 本案辦理室內裝修施工許可申請，施工範圍涵蓋整體室內裝修工程(含機電、消防、空調、軟裝等工程)
- 工程期間：
設計期間 2023/02/03 - 2023/06/20
施工期間 2023/06/13 - 2024/01/23

原。峇形的基地約14年中古屋，本案為全室整修工程。

在空間的重新構築中，以柔和的弧形線條化解銳角，兼顧美感與安全，營造舒適且樂齡友善的生活環境。將原先封閉的窗面拆除，引入日間自然光線，降低人工照明的依賴;在各區域皆設置對外窗，讓空氣流通、光影穿梭，形塑明亮通透的居住品質。隨著光線在屋內重回流動，家的氣息喚回久違的相聚，重新找回生活的溫度與連結。




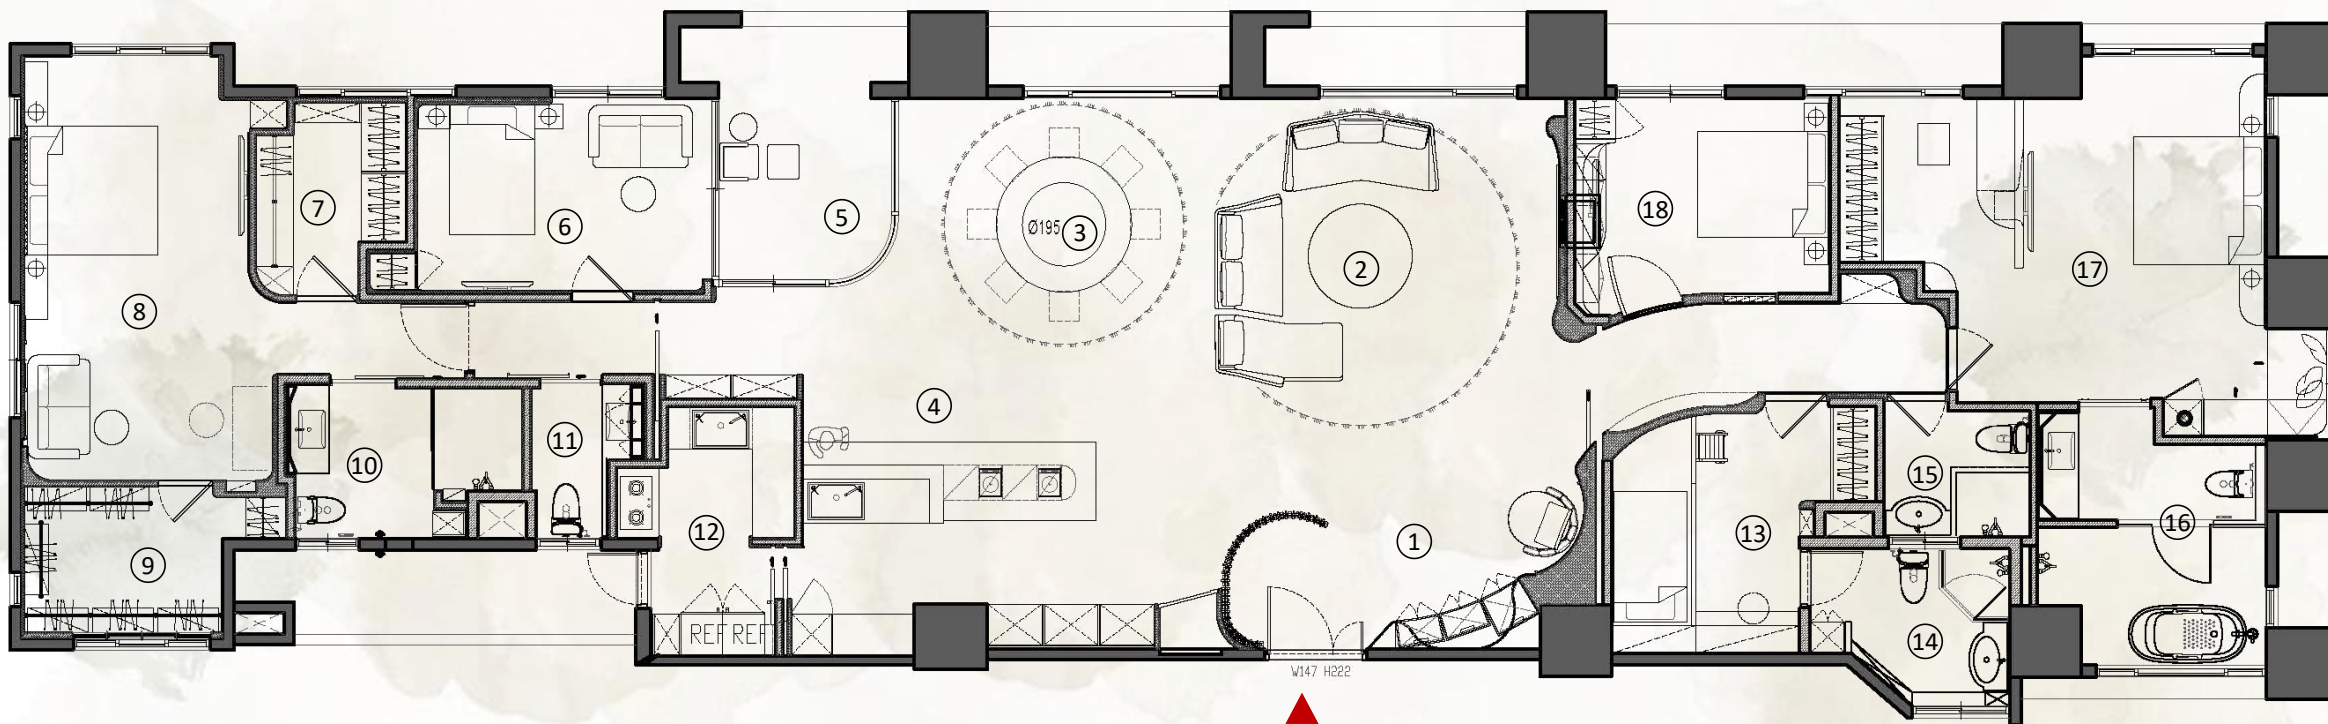



空間名稱

- | | | | |
|-------|-------|---------|---------|
| ① 玄關 | ⑤ 休憩區 | ⑨ 衣帽間 | ⑬ 傭人房 |
| ② 客廳 | ⑥ 次臥A | ⑩ 主臥A衛浴 | ⑭ 傭人房衛浴 |
| ③ 餐廳 | ⑦ 更衣室 | ⑪ 衛生間 | ⑮ 公浴 |
| ④ 輕食區 | ⑧ 主臥A | ⑫ 廚房 | ⑯ 主臥B衛浴 |
| | | | ⑰ 主臥B |
| | | | ⑱ 次臥B |




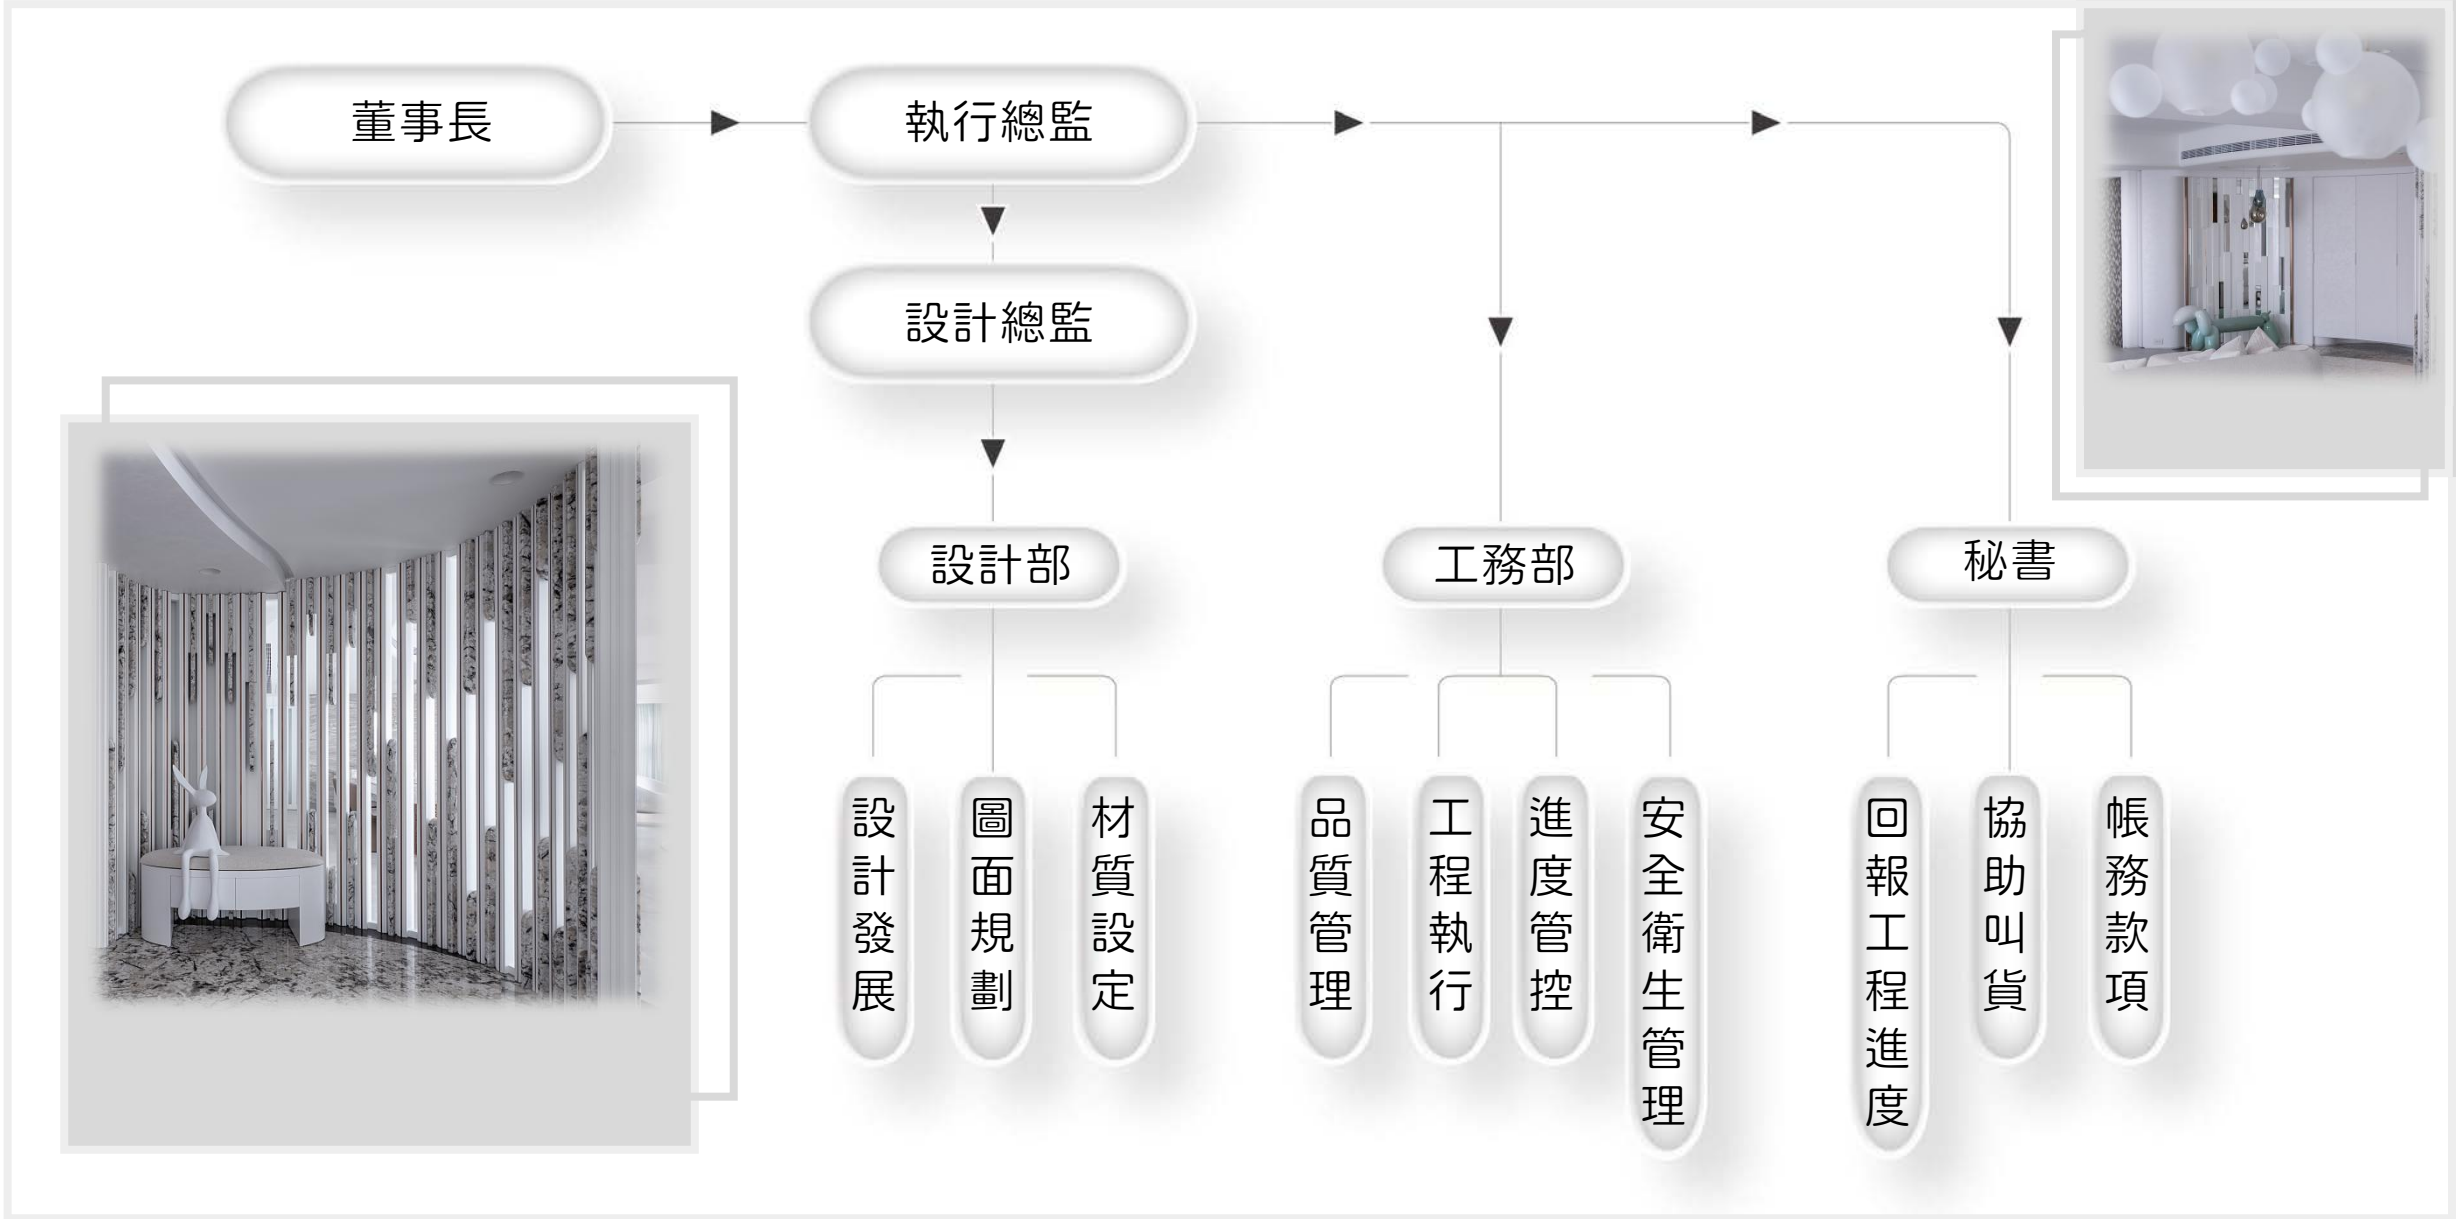

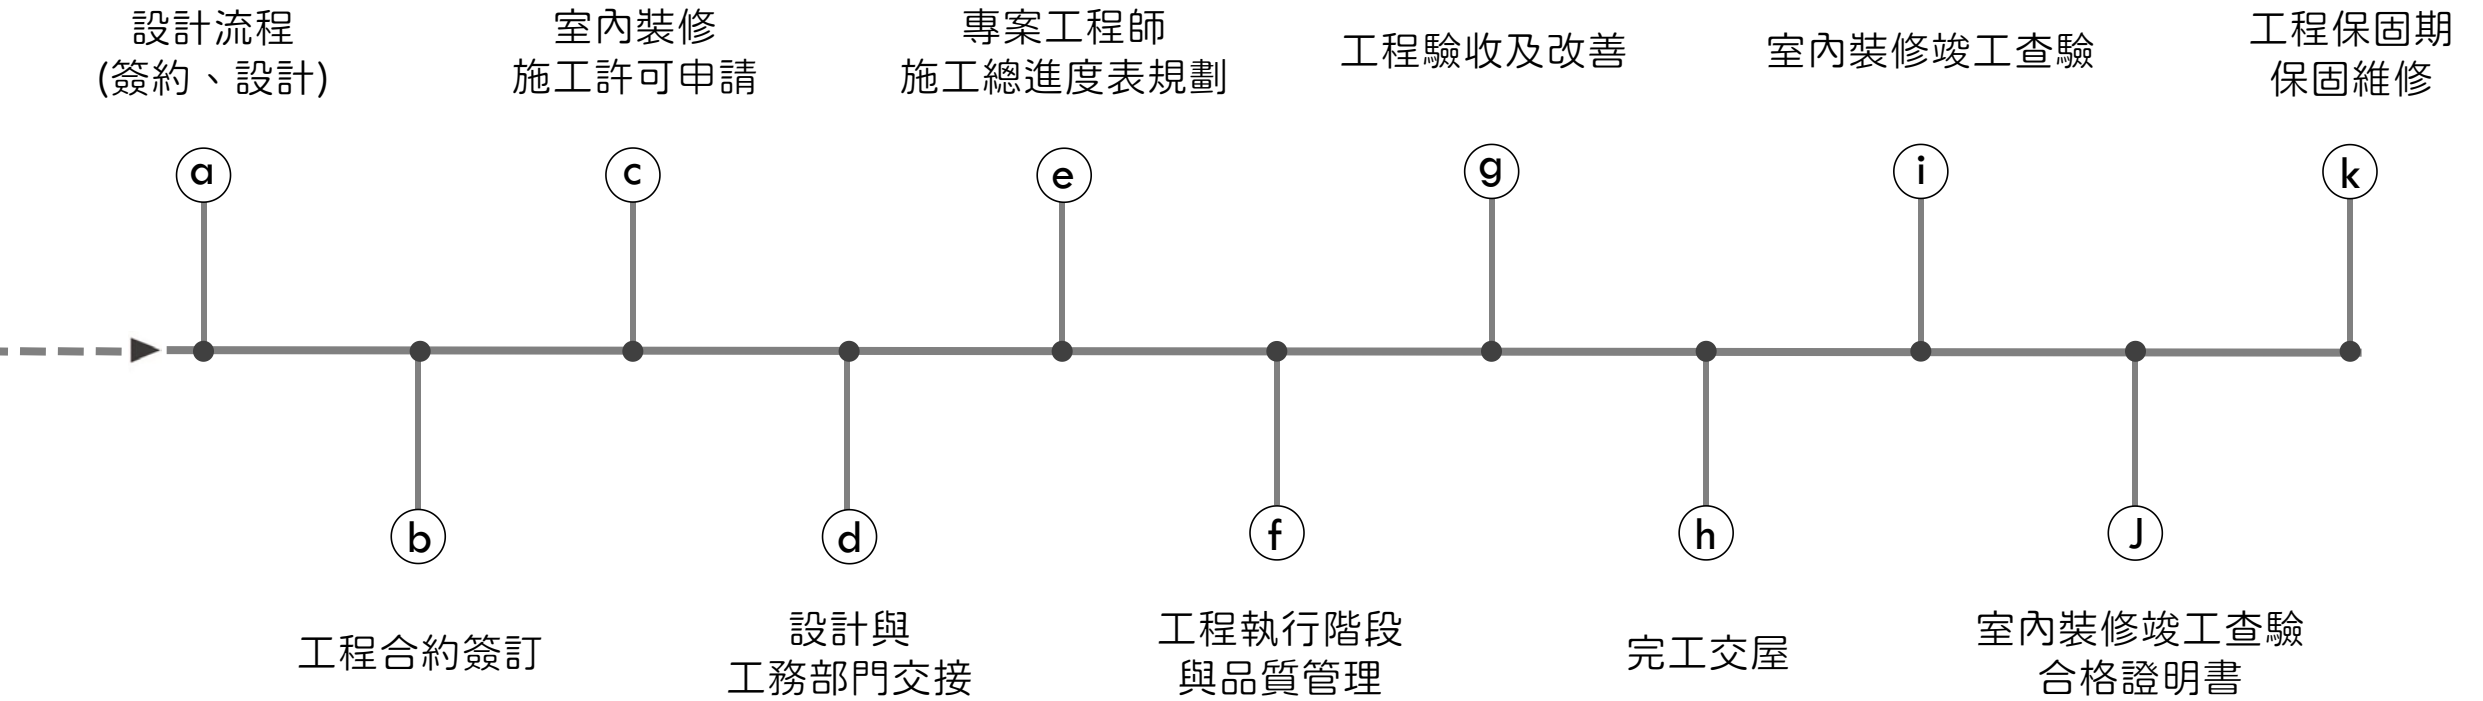

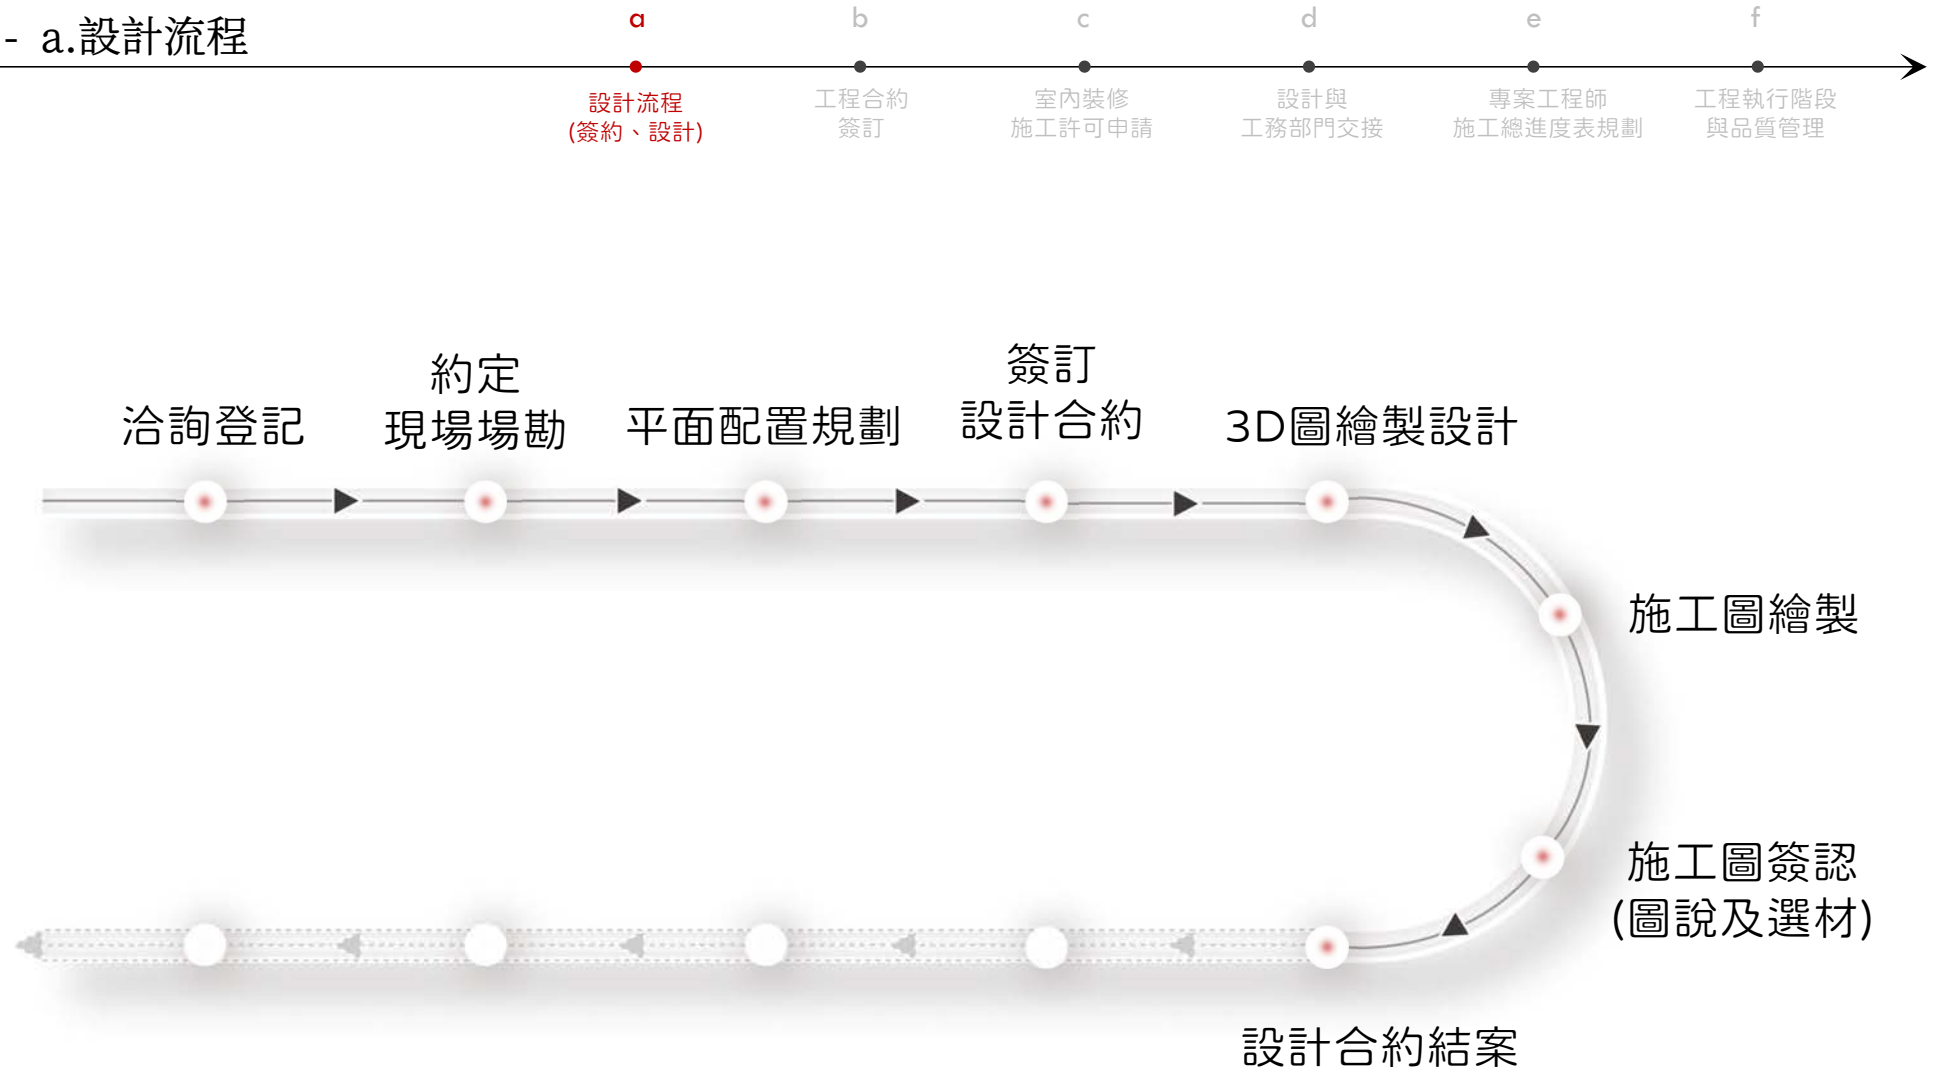

04 案件規劃流程 - b.工程合約簽訂

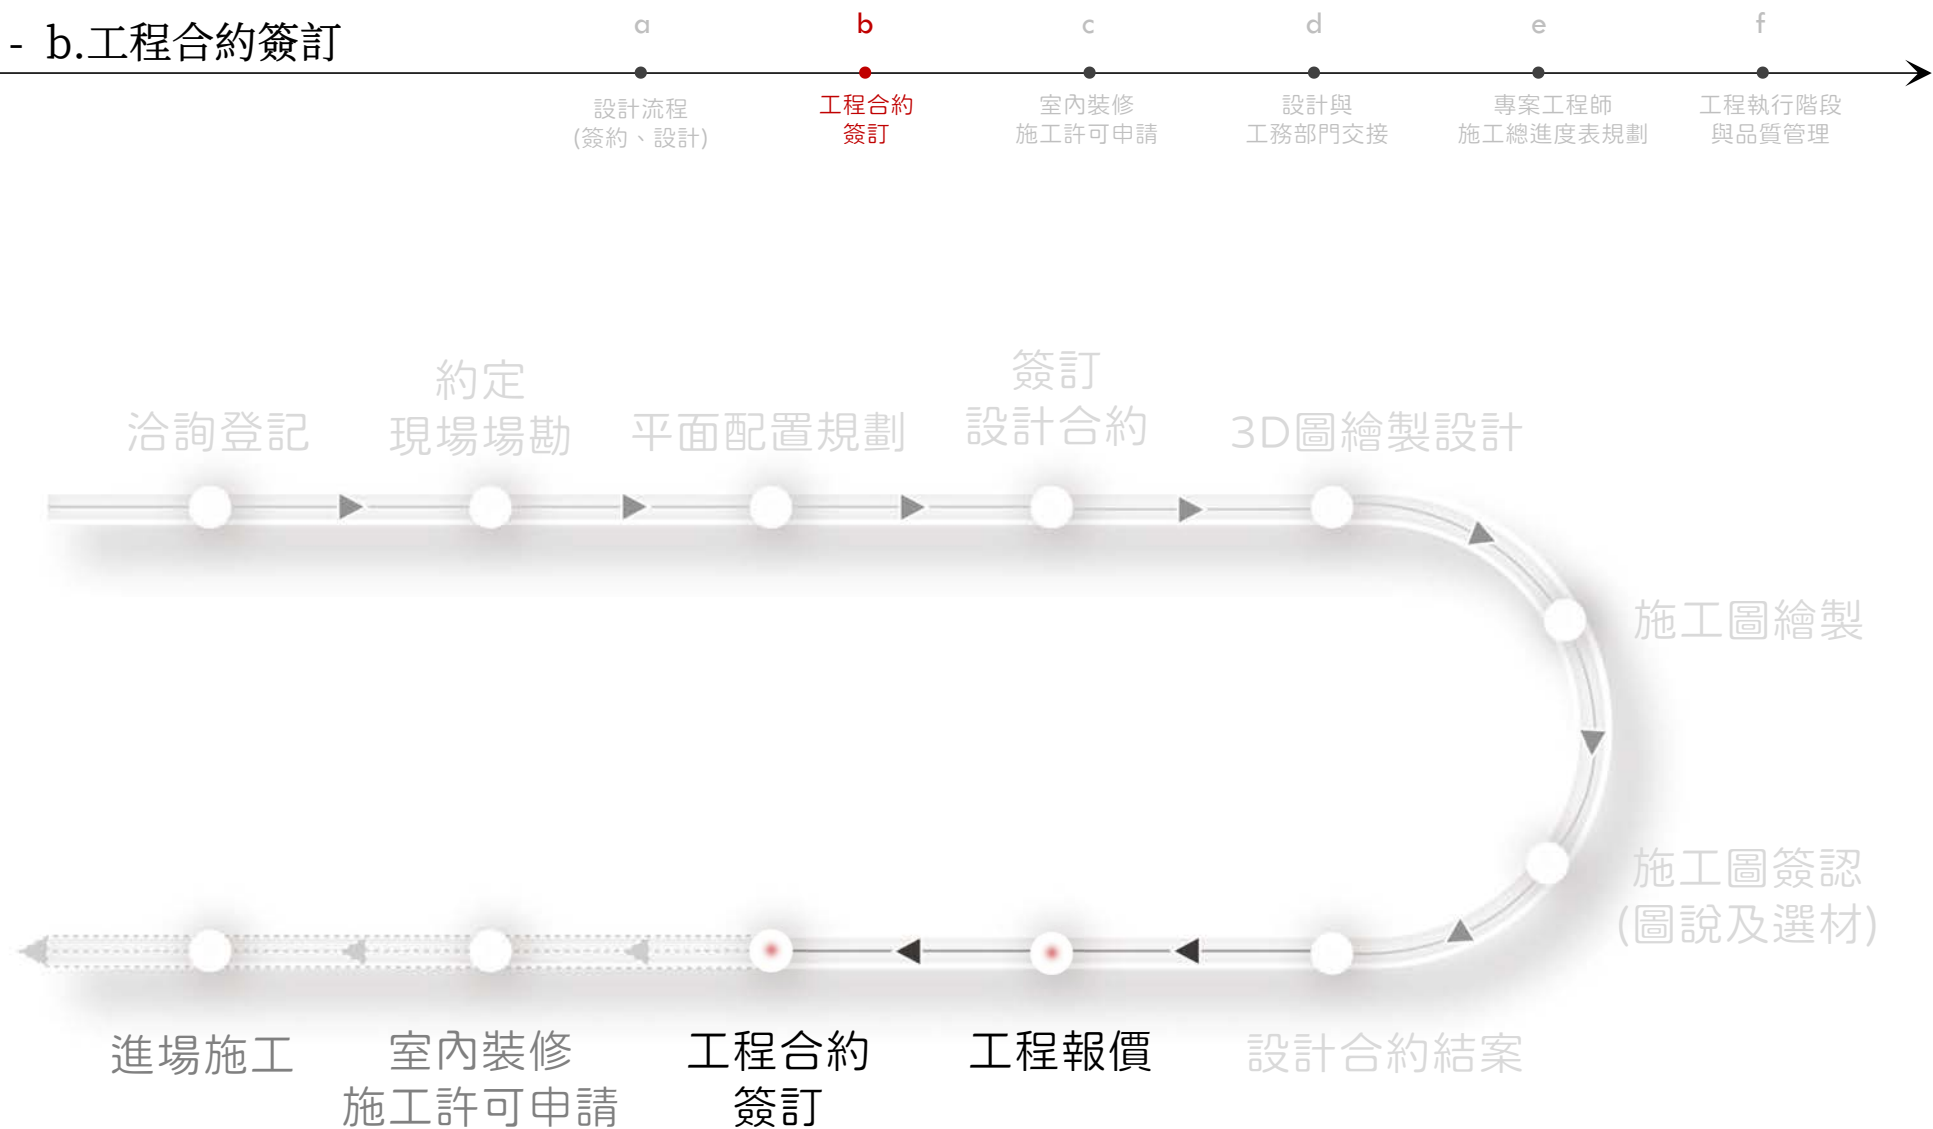

施工許可證申請



室內裝修施工許可證

- 一、本案址建築物室內裝修工程，申請人應依「建築物室內裝修管理辦法」規定，依第 33 條規定，由開業建築師或室內裝修專業設計技術人員檢附室內裝修圖說簽章負責，經審查機構查核符合，准予進行施工。
- 二、施工期間除應遵守公寓大廈住戶規約及區分所有權人會議決議事項外，施工完竣後，應向原審查機構或主管建築機關申請竣工查驗，經臺北市府都市發展局核發「室內裝修合格證明」後，始完成室內裝修申請程序。施工過程如有涉及違章建築（如陽台外推）、非法破壞樑柱、施工噪音擾鄰或違反勞工安全衛生等情事，得報請有關單位查處。
- 三、本施工許可證僅為室內裝修行為之許可，涉及消防設備之變更施工事項，應依相關規定，必要時委託消防設備師或消防安全設備設計監造暫行人員檢計簽證，符合規定，始得進行施工。
- 四、依臺北市府 106 年 5 月 2 日府環空字第 10606055700 號公告規定，於本市各類噪音管制區住宅及公寓大廈平日晚上 10 時至翌日上午 8 時，及假日中午 12 時至下午 2 時、晚上 6 時至翌日上午 8 時，不得使用動力機械從事裝修工程致妨礙安寧之行為，違反者得報請環保局環保稽查大隊查處。但公寓大廈規約或區分所有權人會議決議另有規定者，從其規定。

裝修地址	[模糊]		
裝修住戶	[模糊]	連絡電話	[模糊]
審查人員	翁國揚	審查機構	臺北市建築師公會
設計廠商	[模糊]	連絡電話	[模糊]
施工廠商	[模糊]	連絡電話	[模糊]
施工期間	預定自 112 年 05 月 08 日起至 112 年 11 月 07 日止		

相關連絡電話		室內裝修施工許可備查章	
臺北市建築師公會	02-23773011		
臺北市府環境保護局 (廢棄物、噪音、空污)	1999 市民申訴電話 或 02-25923600		
臺北市勞動檢查處 (職業安全衛生)	1999 市民申訴電話 或 02-23086101		
臺北市建築管理工程處 使用科 (室內裝修)	1999 轉 8387 (外縣市 02-27208889)		
臺北市府消防局 火災預防科	1999 市民申訴電話 或 27297668 轉 6100		
臺北市建築管理工程處 建查報隊	1999 轉 8435 (外縣市 02-27208889)		



※註：本證由主管機關授權審查機構代為核發並張貼於裝修場所之出入口明顯處。

如資料有更動應向審查機構換發施工許可證。



※請自簽收室內裝修許可證上所載任何內容（例如裝修地址、裝修住戶等），或偽造審查人員、審查機構等之署押及印文等不法行為，均為我國刑法偽造文書印文罪章所規範並處罰。

施工進場前，依法申請室內裝修施工許可證，確保工程合法性與結構安全，符合消防及公共安全規範，保障業主權益與施工品質的重要程序。

施工總進度表規劃

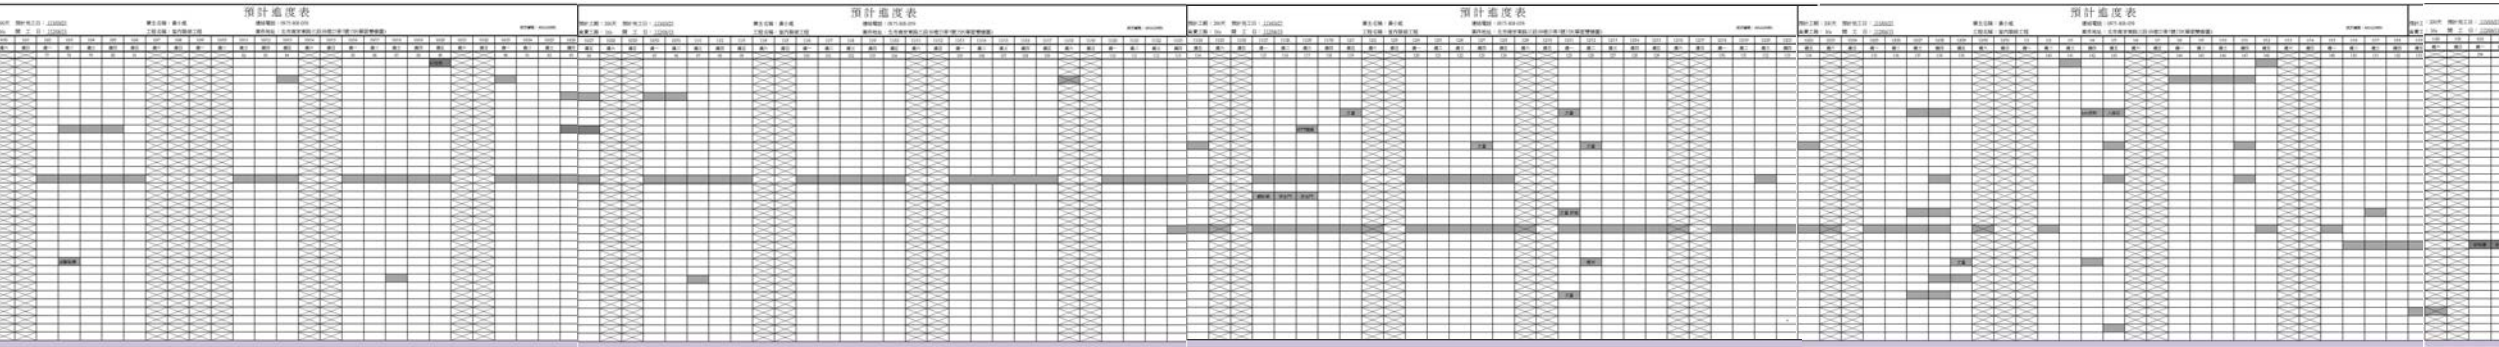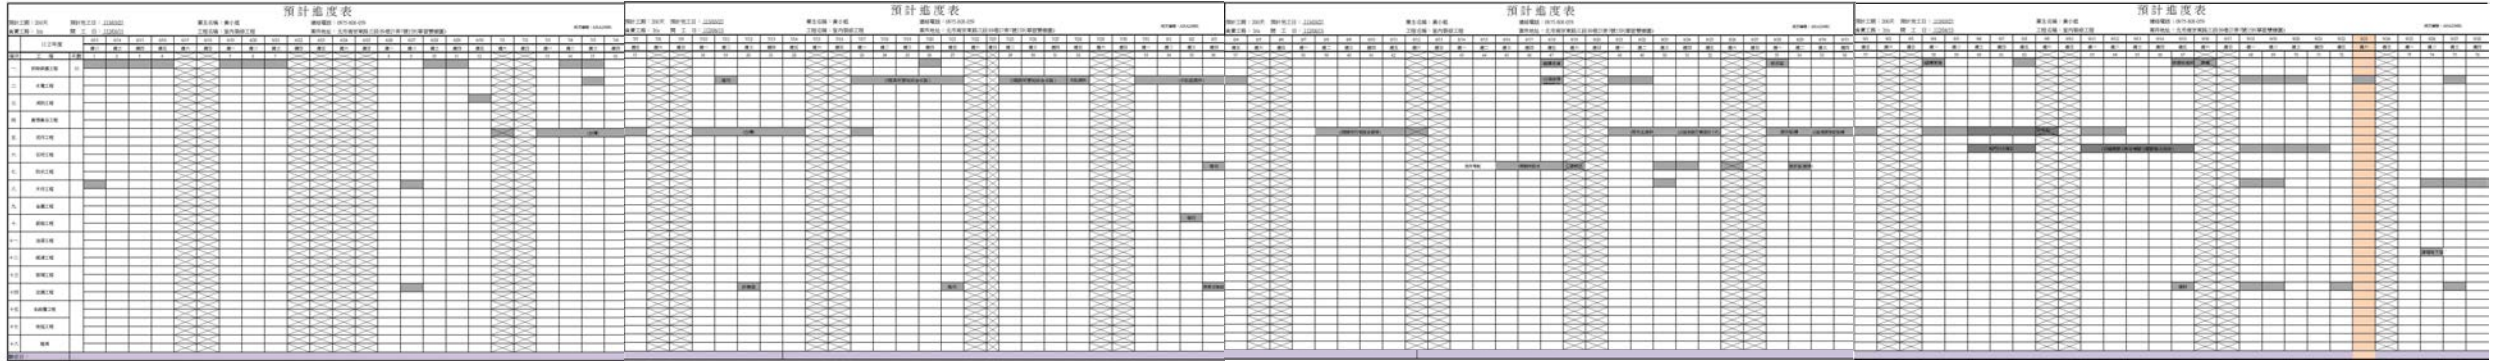


施工進場前，由工務部擬定完整的施工時程甘特圖，依據設計與現場條件，提前規劃各階段工項的工班廠商進場時序。透過明確的時程安排與流程管理，掌握施工節奏與資源調度，確保各階段作業能順利銜接。同時，工務部也會定期與業主進行進度溝通，說明後續現場安排與施工計畫，讓業主清楚掌握工程進展，提升整體協作效率與施工透明度。

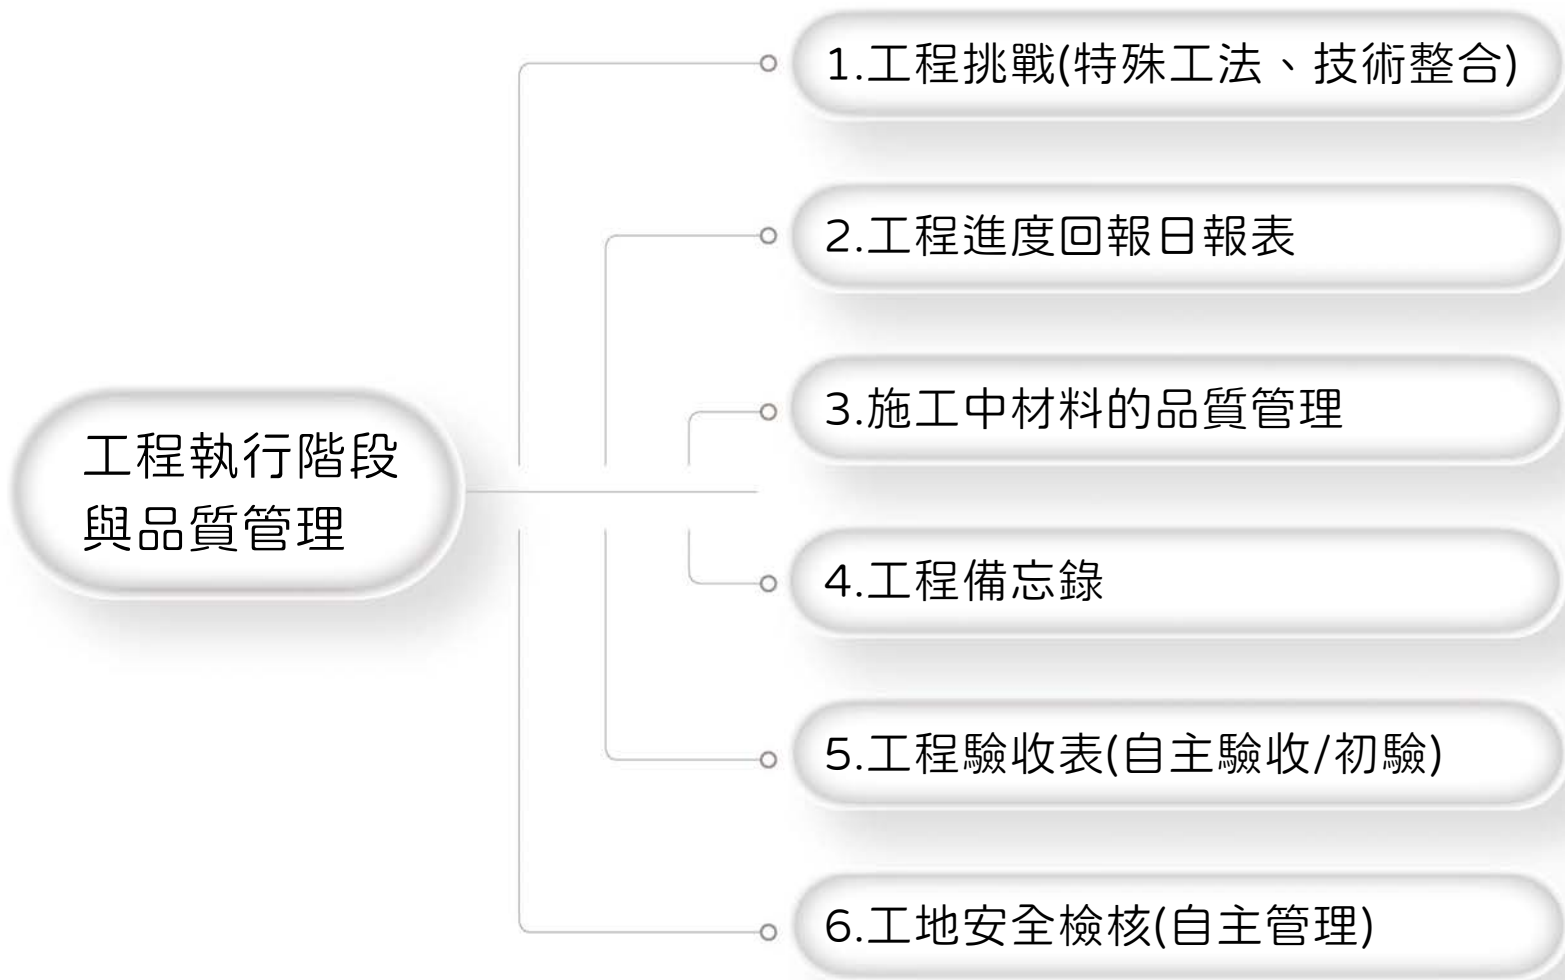


1.工程挑戰(特殊工法、技術整合)/玄關屏風



預設天、地結構基底，材質柱狀結構採弧形路徑進行排列與組構，透過連續曲線的構成手法，形塑空間節奏。

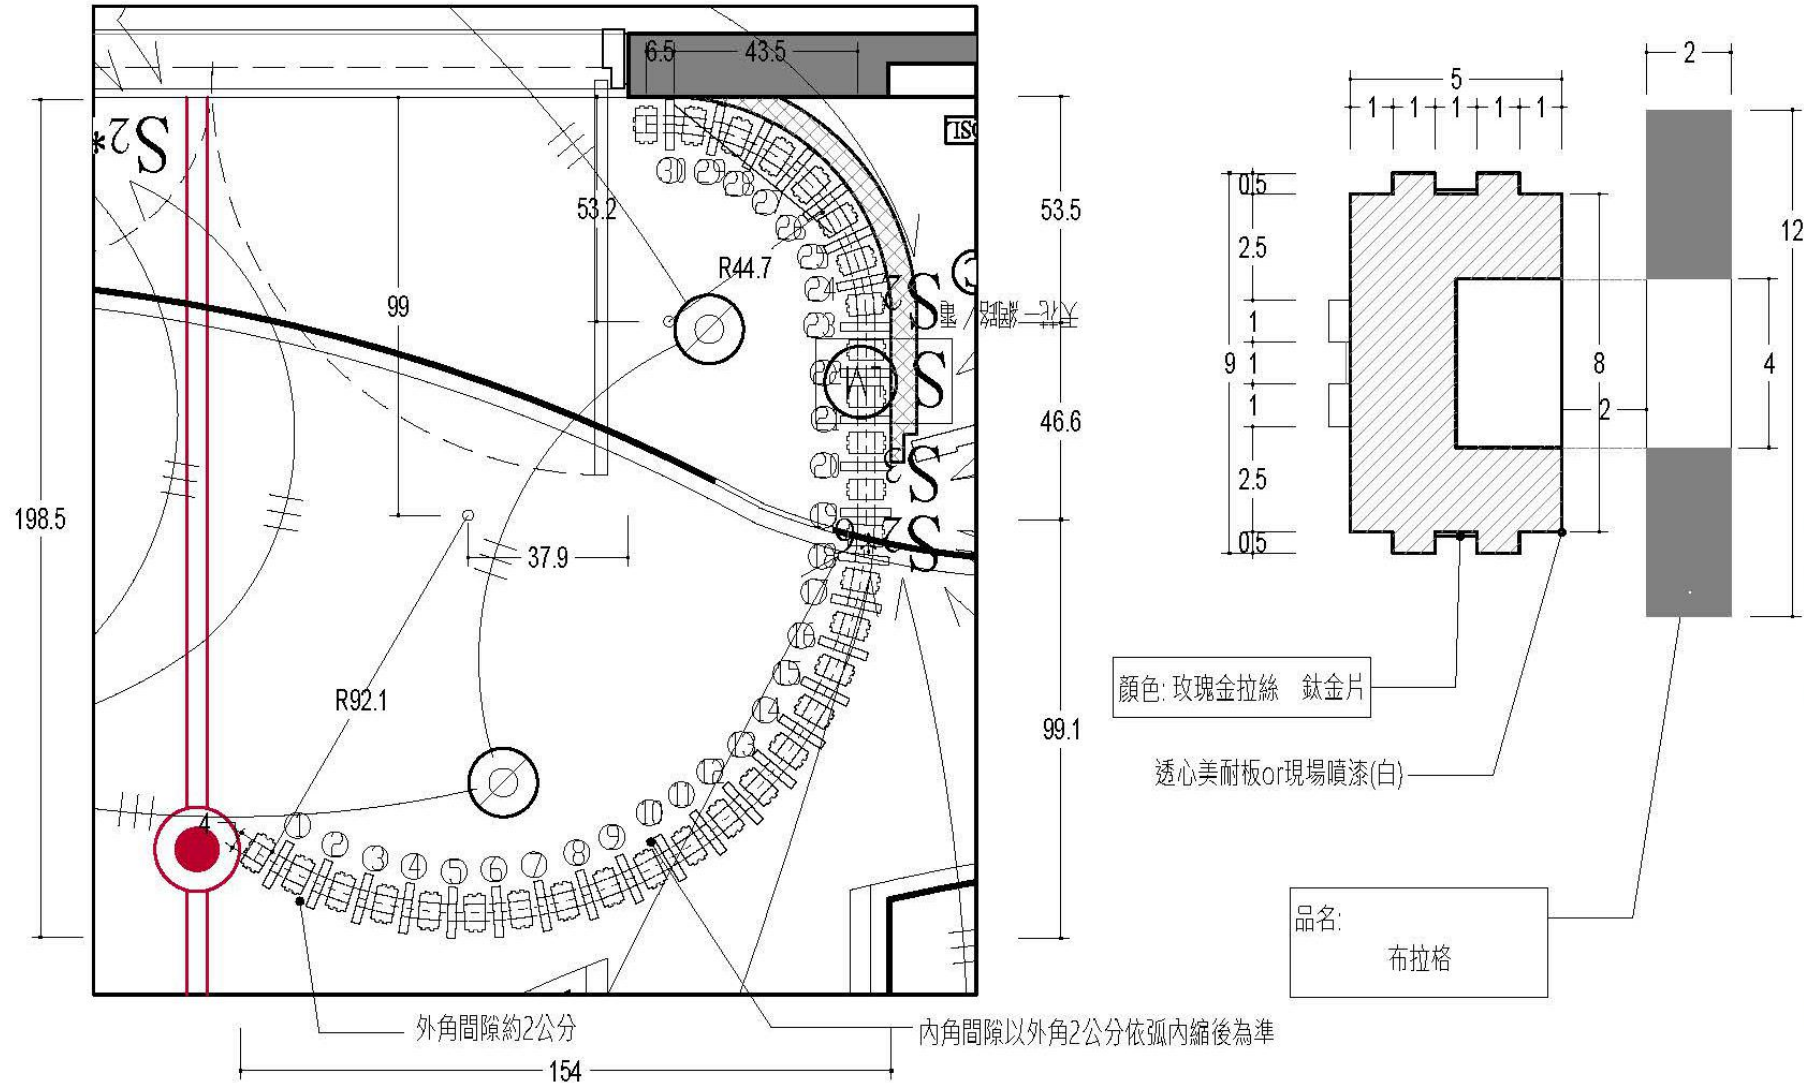


1.工程挑戰(特殊工法、技術整合)/玄關屏風

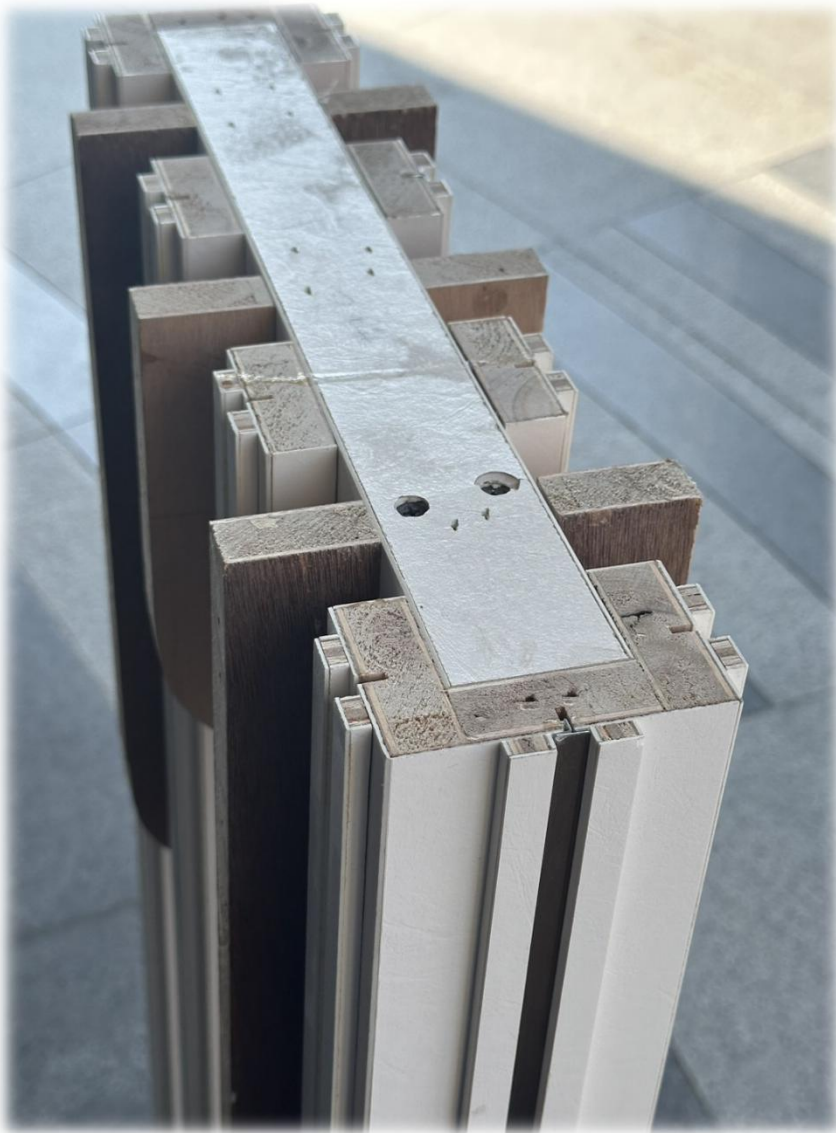

流線型屏風|實體小樣


為確保屏風設計之造型、比例與實際施作的可行性，於設計階段即建立實體小樣模型，作為與業主進行溝通與討論的重要媒介，協助具體呈現設計意圖並凝聚共識。同時，針對木構造、石材及金屬飾條等不同材質之組構關係，亦透過模型進行事前的技術整合與細部模擬，提前檢視施工過程中可能面臨的技術挑戰與施作限制，降低實際介面銜接所產生的問題，以利後續提升整體設計品質與施工精度。

1.工程挑戰(特殊工法、技術整合)/玄關屏風




流線型屏風設計

以硬質材質為語彙，透過細膩的設計手法轉化為柔和的空間質感；高低錯落的設計形塑視覺層次與穿透性，運用弧形布局引導視線流動，使整體視覺動線更加連續且流暢。

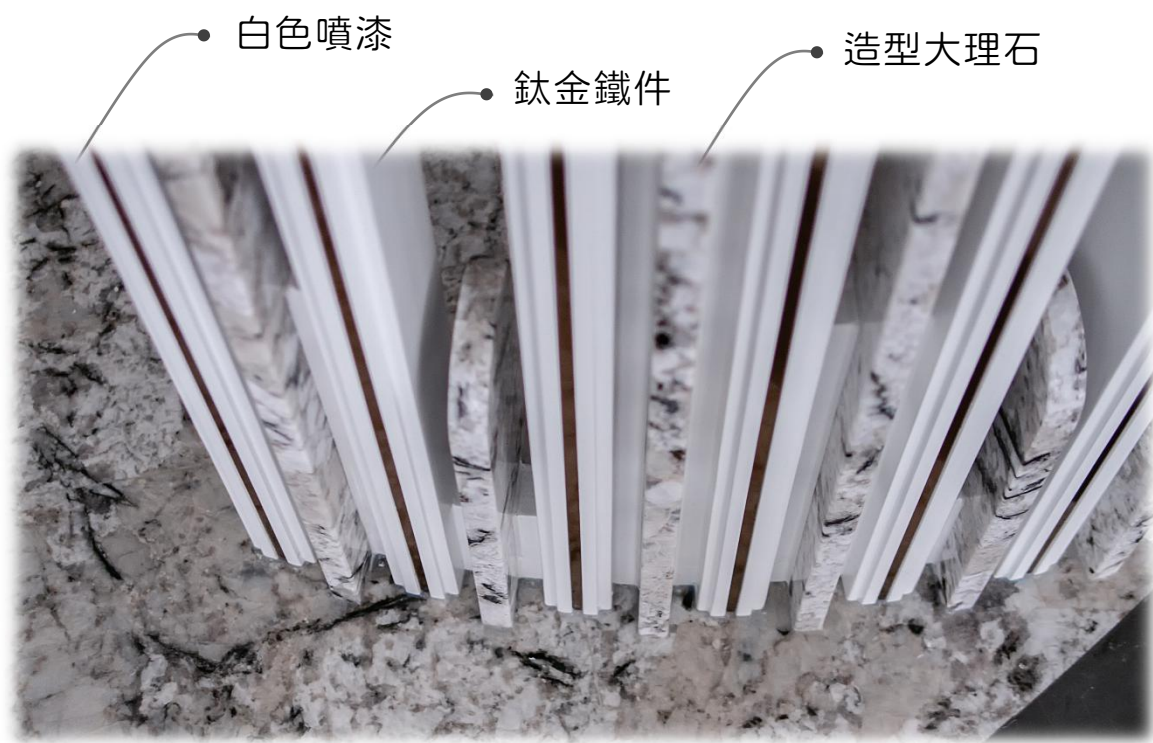


1.工程挑戰(特殊工法、技術整合)/壁排馬桶



馬桶排污管線改設壁排系統

考量無障礙與樂齡友善需求，本案以不墊高衛浴空間為設計前提，重新規劃原有糞管路線，利用收納櫃臥榻下方作為管線配置路徑，並於馬桶後方設置副牆，改採壁排式馬桶系統。透過此方式免除地坪墊高，維持空間平整動線，提升使用安全性與舒適度。

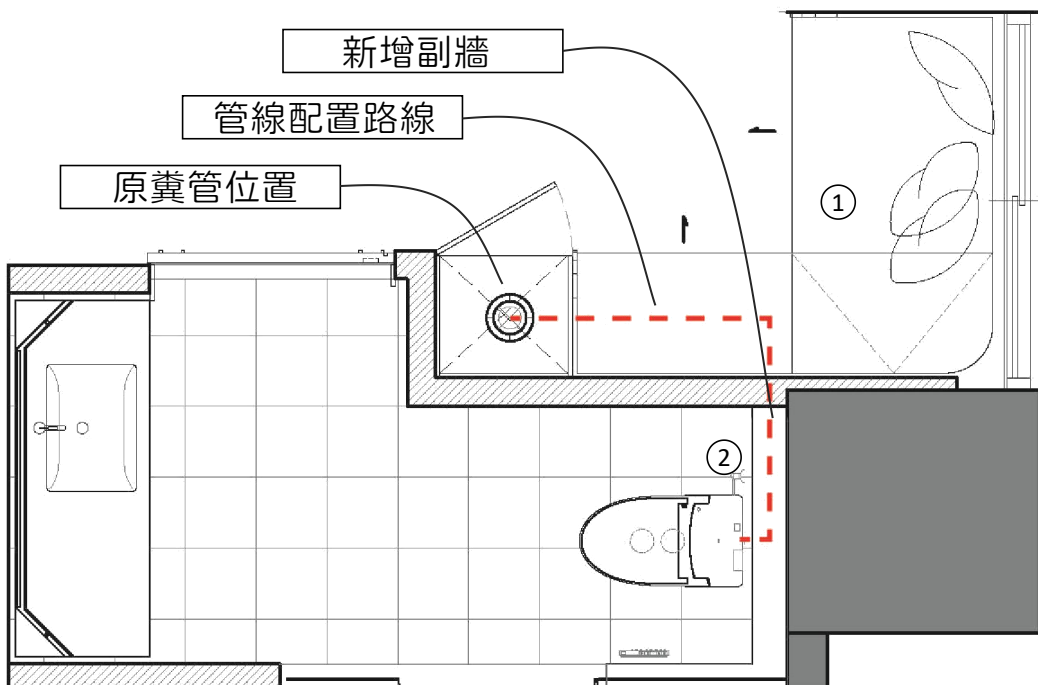


① 臥榻區

② 壁排馬桶



04 案件規劃流程 - f.工程執行階段與品質管理

2.工程進度回報日報表



8/18	三	晴	今日泥作、磁磚 鋪設、水電 埋設防水	
8/17	四	晴	今日泥作工程 磁磚鋪設、水 電、防水	
8/16	三	晴	今日泥作工程 磁磚鋪設工程	
8/15	二	晴	今日泥作帶乾 燥、風扇加強 明日防水	
8/14	一	晴	今日泥作 待泥作乾燥 週三防水進場	
8/11	五	晴	今日泥作 磁磚製作	
8/10	四	晴	今日泥作 磁磚製作	
8/9	三	晴	今日泥作 磁磚製作	

8/15	二	晴	今日泥作帶乾 燥、風扇加強 明日防水	
8/14	一	晴	今日泥作 待泥作乾燥 週三防水進場	

進度內容說明
每日/翌日施作項目

工程執行期間，工務部每日上傳影像並由秘書回報業主現場施工進度。透過即時進度表與影像紀錄，讓業主未親臨現場，也能清楚掌握每日施工成果與現場狀況。提前說明翌日施作項目與安排，使溝通流程順暢透明，讓業主在工程中安心掌握進度，確保施工品質與時程如期推進。

04 案件規劃流程 - f.工程執行階段與品質管理

a

b



c

d

e

f

2. 工程進度回報日報表總覽

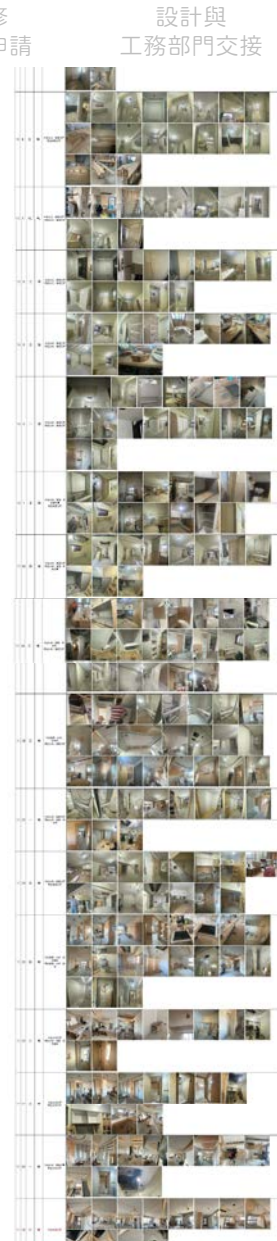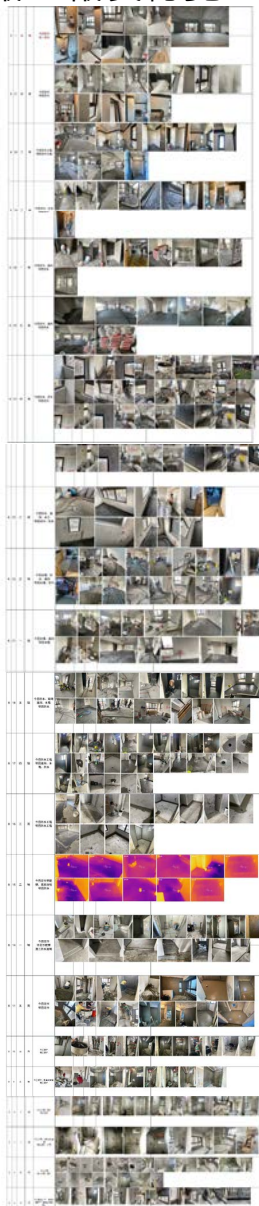

設計流程
(簽約、設計)

工程合約
簽訂

室內裝修
施工許可申請

設計與
工務部門交接

專案工程師
施工總進度表規劃

工程執行階段
與品質管理


01 工程概述

02 工程架構

03 公司組織架構

04 案件規劃流程

05 完工照

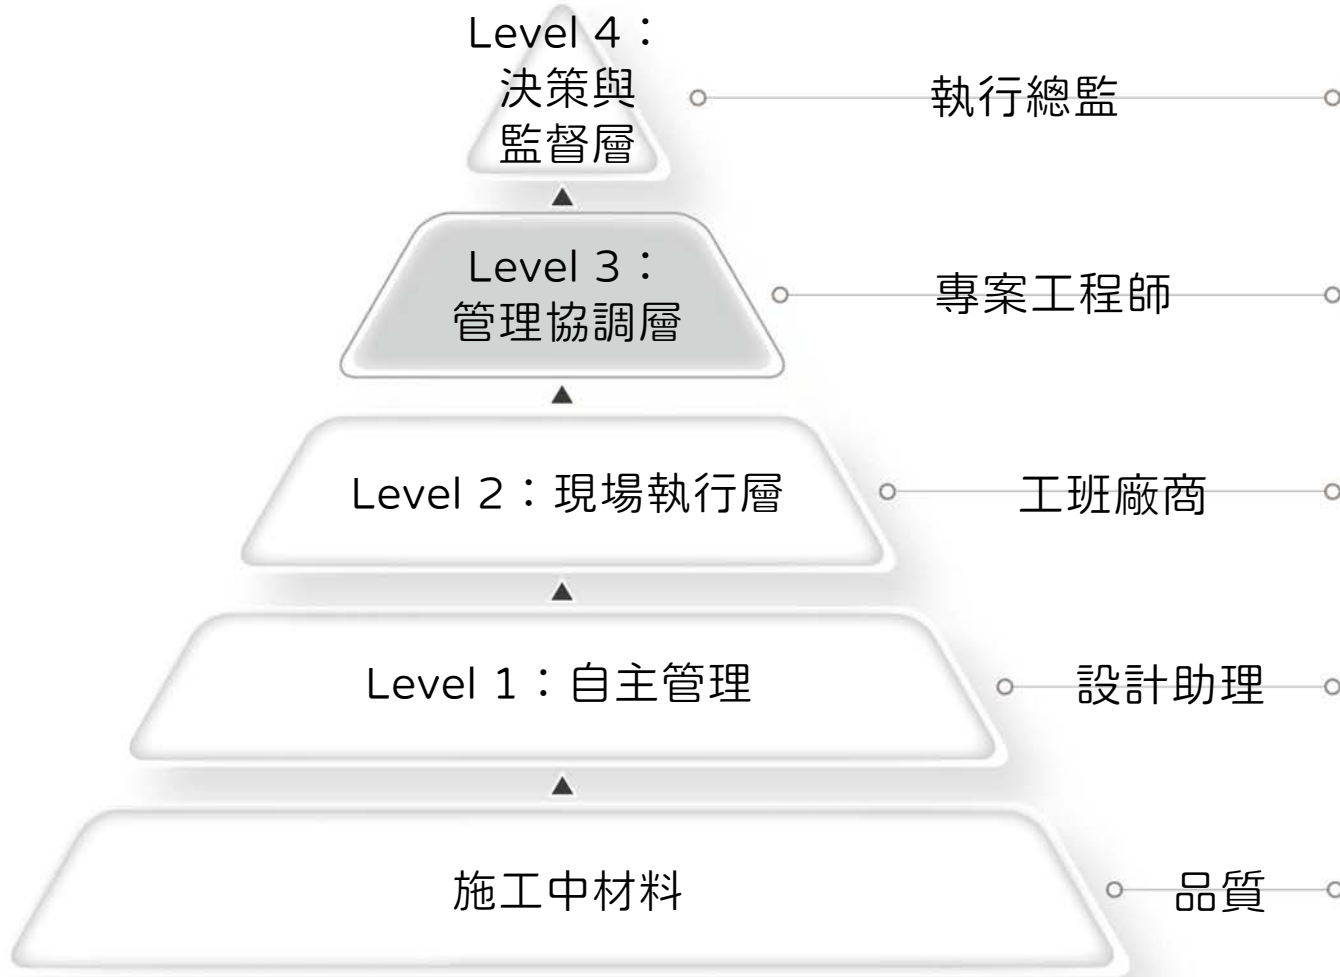

材料品質採取自主管理並建立多重監督機制，從源頭把關進料狀況到現場使用流程，確保所有材質均符合安全標準與品質要求。透過層層檢核與紀錄追蹤，使工程在施工階段能維持穩定的材料品質，進而保障整體施工的安全性與可靠度。

04 案件規劃流程 - f.工程執行階段與品質管理

4.工程備忘錄



透過建立專屬群組，與業主能即時有效溝通，確保雙方資訊同步，並隨時回應業主疑問或需求。同時製作完整的工程備忘錄，詳細記錄每項追加或減少的工項，確保落實執行，並避免任何業主需求被遺漏。提升施工管理的完整性與透明度，也加強了專案溝通的效率與可追溯性。

工程備忘錄

案件編號: A01A236001

業主名稱: 黃小姐
 工項名稱: 室內裝修
 連絡電話: [Redacted]
 案件地址: [Redacted]

日期	工	項	說明	完工期限	業主簽認
	衣帽間	層板(整片)	吊桿(圓桿) 吊桿桿端出外5cm	/ /	/ /
	臥室	系統櫃顏色改色(#+01白風化木紋)	層板櫃深度40cm 吊桿櫃深度50cm 吊桿端出2cm	/ /	/ /
	玄關	弧形屏風(Fluogel 2341)	鞋櫃、衣帽櫃顏色(永吉水晶板A001)	/ /	/ /
	廚房	門片顏色(5面水晶晶)(勝鈔A19(能品鋼烤)	烤漆玻璃 顏色(生先I 鋁起白)	/ /	水管加設瓷精龍頭
	鞋衣區	高層門片(永吉水晶晶A001)	中層櫃(永吉水晶板A001)	/ /	衣鞋區高櫃(永吉水晶板A001)
	全區	浴櫃(5面水晶晶)(勝鈔水晶板 W501)		/ /	/ /
	次臥	系統衣櫃改色(補身#+01)(門片藍木E-110荷花白)		/ /	/ /
	線子房	系統衣櫃改色	送器出風口(下出風、上回風)	/ /	/ /
	備人房	工作桌、吊櫃改色	系統衣櫃改色(#+01白風化木紋)	/ /	/ /

日期	追加減項目	單位	數量	單價	金額	說明	完工期限	業主簽認
	複藏量	洗衣檯	ST-575				/ /	/ /
							/ /	/ /
							/ /	/ /
							/ /	/ /
							/ /	/ /

1. 本備忘錄經業主簽認後，交由 [Redacted] 憑辦。
 2. 本備忘錄視同合約一部份，雙方據以辦理追加減帳及工期核計。

主管: [Redacted] 主辦工程師: [Redacted]

工程備忘錄

案件編號: A01A236001

業主名稱: 黃小姐
 工項名稱: 室內裝修
 連絡電話: [Redacted]
 案件地址: [Redacted]


日期	工	項	說明	完工期限	業主簽認
	備人房	床與床尾櫃改色	永吉P65灰岩尤加利(北華品)	/ /	11/11/24
		原056 F1板無法拆裝	有與鞋櫃改用F3板 因廠更改時間 叫拆	/ /	/ /
				/ /	/ /
	王取鏡	高層板櫃	上櫃-H牌門, 抽片石材, 下方抽屜	/ /	11/11/24
				/ /	/ /
				/ /	/ /
	明瑞	公用浴室石材更改		/ /	/ /
				/ /	/ /

日期	追加減項目	單位	數量	單價	金額	說明	完工期限	業主簽認
							/ /	/ /
							/ /	/ /
							/ /	/ /
							/ /	/ /
							/ /	/ /

1. 本備忘錄經業主簽認後，交由 [Redacted] 憑辦。
 2. 本備忘錄視同合約一部份，雙方據以辦理追加減帳及工期核計。

主管: [Redacted] 主辦工程師: [Redacted]

5.工程驗收表(自主驗收/初驗)



工程驗收單

案件編號: A01A236001

業主名稱: 黃小姐

聯絡電話:


工項名稱:

案件地址:

工程驗收記錄			
序	須注意或待改善工項	內容說明	完成日期
1.	客餐廳軟件門合驗膠須加強固定		//
2.	玄關大理石不齊圓收邊修飾(砌磚)清專門打砂康美		//
3.	全室地磚膠填縫色差,美觀,即夕再進場修改		//
4.	波隆地毯壓條(臥室)美觀,起來		//
5.	全室精面塗料修補		//
6.	玄關車庫門膠修飾		//
7.	窗框與窗不順		//
8.	後陽台舊磁磚破損,砌磚修補		//
9.	全室排水包通,通管保養		//
10.	玻璃刮傷,請玻璃廠處理(客廳/餐廳/臥房)		//
11.	七房房頂綉布未黏色		//
12.	中長下方IH炸通風短抽,散熱片		//
			//
<input type="checkbox"/>	保固卡寄送地址:		//
<input type="checkbox"/>	新安裝燈具更換燈泡是否與業主說明	主燈	//
(主) 工程驗收確認			業主簽章 確認日期
<input checked="" type="checkbox"/>	驗收無誤:本工程已完工並驗收無誤。		11/31/123
<input checked="" type="checkbox"/>	局部驗收:待改善工項須再修正,其餘工項驗收完成。		11/31/116
<input type="checkbox"/>	因業主須提早進住,所以本工程提前完成驗收並點交給業主。		//
<input type="checkbox"/>	因業主因素,本工程先驗收完成,上列項目___天內維修完工。		//
<input type="checkbox"/>			//
<input type="checkbox"/>			//

工務主管依據核定施工圖說及各工項內容，於工程階段至現場會同工務人員及施工廠商進行首次查驗，確認施工品質、工法執行及與設計圖說之符合性，並針對缺失項目要求修正改善。待修正完成並確認無誤後，再安排業主進行驗收，以確保施工成果符合設計要求與品質標準。

6.工地安全檢核(自主管理)



裝潢施工違規罰則

項次	違規事項	計算方式	罰鍰金額	備註
1	工作場所室內禁止抽菸(至抽菸區)	次	2000	
2	工作場所室內禁止酗酒、賭博、滋事	次	1500	情節重大者報警處理
3	浴室/廚具設備禁止使用(含馬桶)	次	1000	若有損壞須另全額賠償換新(費用另計)
4	未依規定配帶安全設備及設施	次	2000	
5	便當、飲料、食物使用完垃圾未帶走	次	1500	
6	水泥砂/溶劑到至水管造成堵塞損壞	次	2000	若有損壞通管產生之費用另計
7	隨地丟棄垃圾、菸蒂、亂吐檳榔等	次	1000	
8	每日下班須環境整理(木削、地板、垃圾)	次	1000	
9	未依社區裝潢規定違規被舉發者	次	2000	若有社區違規扣款產生之費用另計
10	裝潢產生廢棄物料未裝袋放置規定位置	次	2000	若有社區違規扣款產生之費用另計
11	禁止隨地大小便	次	2000	
12	隨手關門	次	1000	

以上若違規第二次加罰一倍

~辛苦了! 安全又好的工作環境是須要靠大家一起維護的~

※ 詳細閱讀後請在此處簽名 ※

林政豪	劉子書	曹麗峰
李政豪	朱政豪	張新洲
李明達	林政豪	王元
陳政豪	張子怡	王元
王政豪	王政豪	王元

裝潢施工違規罰則

項次	違規事項	計算方式	罰鍰金額	備註
1	工作場所室內禁止飲酒、酒精性飲品	次	30萬	
2	工作場所室內禁止飲用酒精性飲品者	次	30萬	

工地飲酒致職災最高罰30萬

禁止勞工在工作前及工作時飲酒，若而導致在作業時發生職業災害，可依違反《職業安全衛生法》規定，依法處30萬元罰鍰。
※嚴格禁止勞工在工作前及工作時飲酒

~辛苦了! 安全又好的工作環境是須要靠大家一起維護的~


※ 詳細閱讀後請在此處簽名 ※

林政豪	林政豪
李明達	張子怡
陳政豪	吳建輝
王政豪	李志明
曹麗峰	曹麗峰
張新洲	張新洲
王元	王元
王政豪	王政豪

確保施工期間的安全性、整潔度，現場全面禁止抽菸、飲酒及其他可能影響作業品質之行為。於各工班進場前，在工地出入口位置公告並張貼《工地安全須知》與《施工罰則》，以提醒並要求所有作業人員遵循既定規範。透過明確的告示、事前宣導與現場管理，強化人員的安全意識，維持良好施工環境，並降低意外發生與施工品質受影響的風險。

04 案件規劃流程 - f.工程執行階段與品質管理

6. 工地安全檢核(自主管理)



日期	星期	值班人員簽名	門窗關閉	垃圾帶走	工地打掃	馬桶清理	梯間打掃	工具歸位	總開關關閉	水龍頭關閉	主辦工程師簽名
6月28日	週三	Tom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Toby
6月29日	週四	Tom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Toby
6月30日	週五										
7月3日	週一	Tom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Toby

在工程執行期間，每日離開工地前，需確實檢查所有窗戶是否關閉、電箱總開關是否切斷，確保現場安全無虞。同時依照「每日清潔表」進行環境整理與檢核，完成後逐項勾選記錄，以維持工地的整潔與作業動線的安全。相關檢核結果將於每週的工程會議中進行檢討，針對需要改善之處提出調整措施，以持續優化施工品質與現場管理流程。

6.工地安全檢核(自主管理)

a
設計流程
(簽約、設計)

b
工程合約
簽訂

c
室內裝修
施工許可申請

d
設計與
工務部門交接



e
專案工程師
施工總進度表規劃

f
工程執行階段
與品質管理



規定在高空作業之人員，於作業全程必須正確配戴安全帽、安全帶及相關防護裝備，確保作業安全。由現場負責人-專案工程師進行設備檢查與安全提醒，確保防護器材完備且符合標準。落實個人防護措施與現場控管，有效降低高空作業風險，保障作業人員的人身安全並維持施工品質。


工地內設置滅火器及相關消防設備，由現場負責人-專案工程師定期巡檢，確保所有器材均可隨時啟用，提升初期火災的應變能力。針對施工過程中可能產生的廢水，現場設置洗手槽與簡易過濾水槽，使工具清洗或地面沖洗所排出的廢水能先經過濾處理，再行排放。減少泥漿及砂土堵塞排水管線，確保工地環境整潔並維持正常排水。

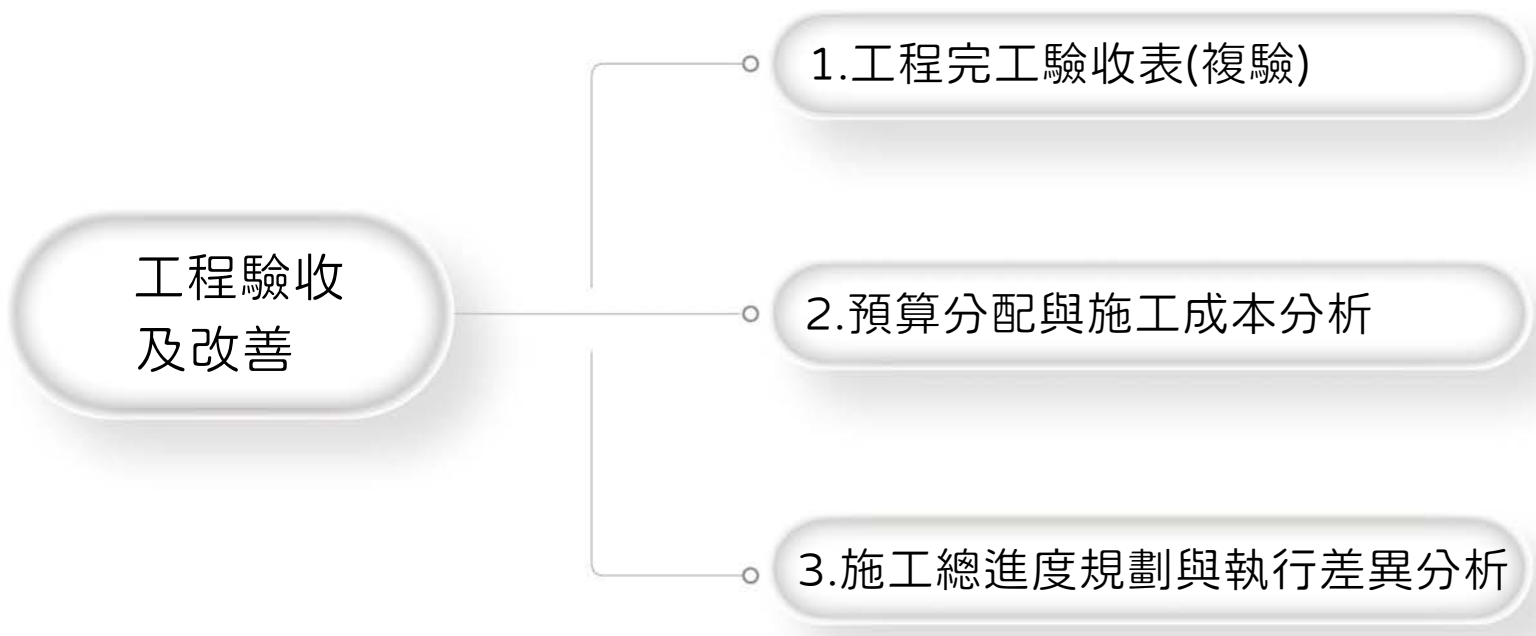


04 案件規劃流程 - g.工程驗收及改善

2.預算分配與施工成本分析


工程成本控管

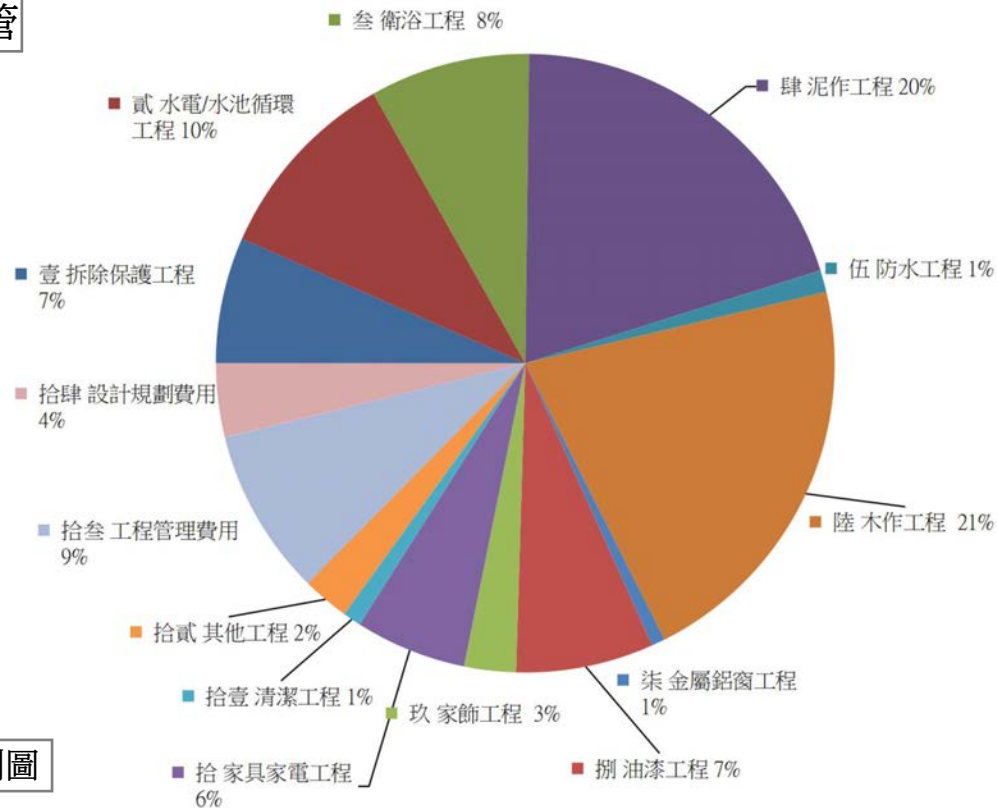

預算分配比例圖




成本分析比例圖

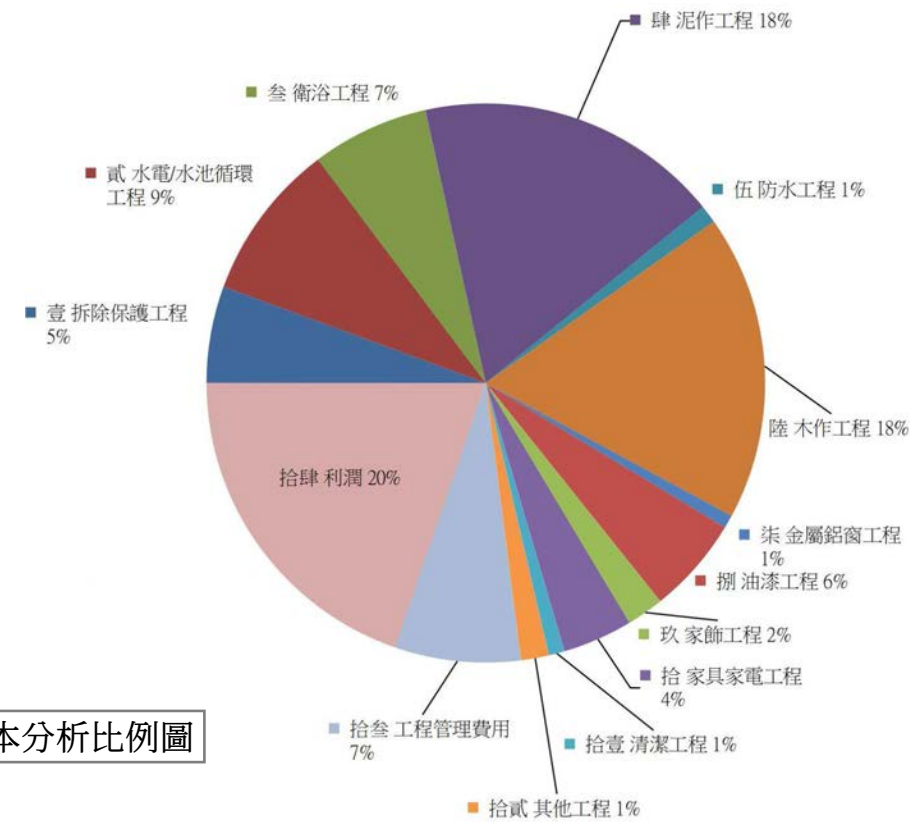

在工程執行期間，透過預算分配與成本分析，詳細檢視各工項的費用構成與成本比例，判斷成本配置與經費分配的合理性，確保整體預算、人力投入與施工進度皆維持在可控範圍內。同時，持續監控實際施工狀況，定期比對原先預估的成本與現場花費，若發現任何超支或異動情形，即時調整預算配置與作業安排，以有效控制工程成本並兼顧施工品質。

3.施工總進度規劃與執行差異分析

工程時程控管

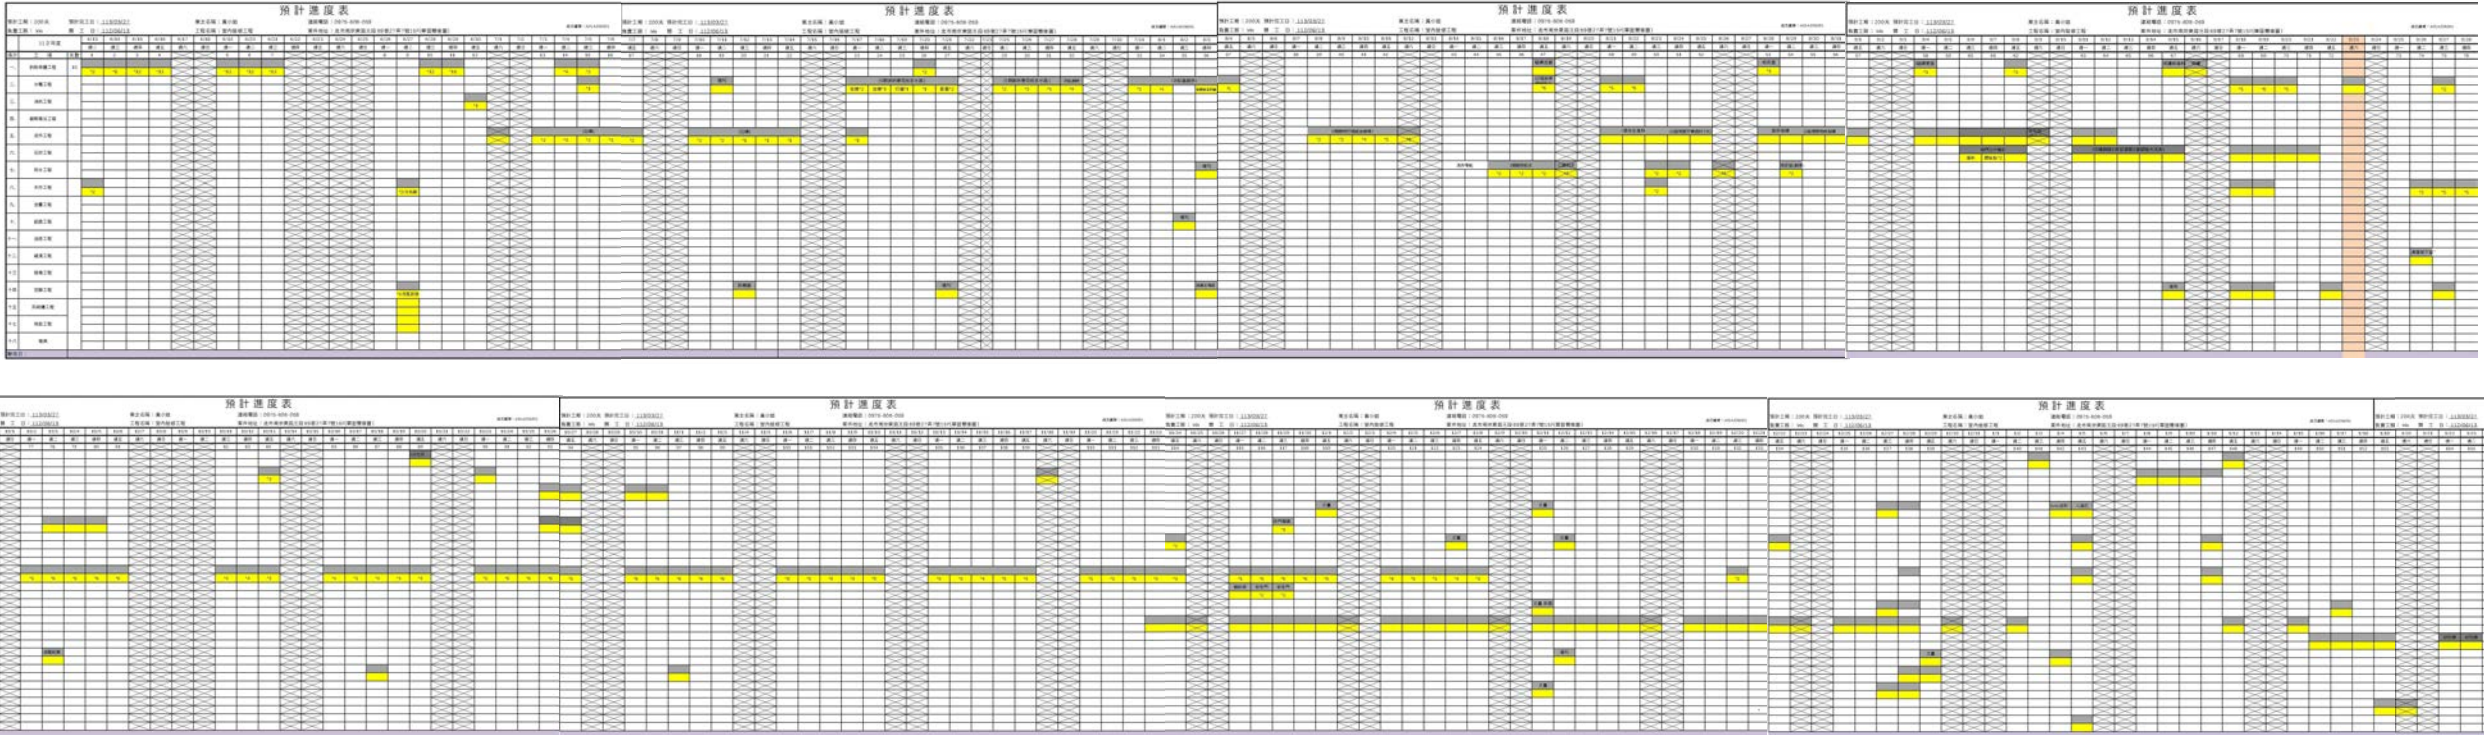

在工程執行期間，定期對照預排的工程進度規劃進行差異分析，檢視實際施工進度是否與原先時程產生落差。若發現任何延誤、提前或異動情形，將立即研判原因並進行進度調整，必要時提出趕工策略或作業重新配置，以確保工期管控得當，並在效率與品質之間維持最佳平衡。

f
工程執行階段
與品質管理

g
工程驗收
及改善

h
完工交屋

i
室內裝修
竣工查驗

j
室內裝修
竣工查驗
合格證明書

k
工程保固期
保固維修



在完工交屋前，將先進行全屋臭氧殺菌作業，徹底清除空氣中及各種表面可能殘留的細菌、病毒及異味，並有效抑制微生物滋生，確保室內環境的衛生與居住安全。此作業可提供業主一個乾淨、健康且舒適的居住空間，同時提升交屋品質與居家安心感。

04 案件規劃流程 - i.室內裝修 竣工查驗

f
工程執行階段
與品質管理

g
工程驗收
及改善

h
完工交屋

i
室內裝修
竣工查驗

j
室內裝修
竣工查驗
合格證明書

k
工程保固期
保固維修

30



工程完工後，依法向主管機關提出室內裝修竣工查驗申請，確保施工成果完整且符合設計規範與施工品質，並遵循相關法規與安全標準。

同時，此程序可驗證工程各項作業是否落實，保障業主權益，確保室內空間的安全性與使用品質。



建築物室內裝修概要			
建築物要項	裝修位置	申請面積(mi)	用途
地上015層	天花板、分間牆、牆面、防火門(廚房出入口大門)	264.14	H-2集合住宅(5號:123.39mi、7號:140.75mi)
總計		264.14	

備註：
 建造執照號碼：96建字第0388號
 使用執照號碼：98使字第0330號
 變更執照號碼：
 本案屬「臺北市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照管理辦法」規定應辦理一定規模以下變更程序項目(防火區劃)，已另由翁國揚建築師簽證負責，檢附相關文件圖說併案申請竣工審查。

註：
 1. 本證明所載之「用途」，僅係供作檢討建築技術規則有關內部裝修材料、分間牆構造等規定之依據，至若與使用執照(或變更使用執照)所載用途不符者，當得視實際需要另案辦理變更使用執照，且不得作為申請本府各機關營業證照之證明文件。
 2. 室內裝修圖說範圍如涉有違建，仍應依現行違建處理原則辦理。

建築物室內裝修合格證明

合格證明字號：113裝修(後)第1779號

申請人：[姓名]

建築物室內裝修地址：[地址]

建築物室內裝修設計廠商：[廠商]

建築物室內裝修施工廠商：[廠商]

審查機構：臺北市建築師公會

查驗人員：翁國揚

發證機關：臺北市府都市發展局

局長 王玉芬

中華民國 一 一 一 年 四 月 十 一 日

註：本合格證明依內政部訂頒建築物室內裝修管理辦法核發。

經查驗通過後，正式辦理交屋或進行使用，確保業主權益並維持工程安全與驗收品質。主管機關將隨後核發室內裝修竣工查驗合格證，作為工程符合法規規範與安全標準的重要依據。



NO. A01A236001

保固卡 Warranty Card

保固說明


- 本工程自驗收完工之日起由保固單位責任保固壹年。
- 保固期內如發生損壞時，除因人為不當使用天災、人禍或非可歸責於保固單位等原因外，保固單位應負責修理(耗材除外)。
- 保固單位應於接到保固通知一周內與業主聯絡，約勘察損壞狀況。

不承保範圍

- 因天災地變如颱風、火災、水災、地震、雷電、雨災、風災或不可抗力之災變所引起之損壞。
- 因人為不當使用或破壞而導致之損壞。
- 耗材類或自然耗損等情形。
- 因他人的工程導致施工內容損壞或變質者。
- 因第三人、相關法律或結構問題導致施工困難。
- 內容中另有記載不承保範圍之事項、已作價金折讓之工程範圍或贈品。(與保固之介面工項，則不在保固修復範圍內)

保固範圍

業主名稱：[模糊] 聯絡電話：[模糊]
 保固地址：[模糊]
 保固期間：保固 113/01/30~114/01/29
 保固範圍：依施工確認單所列項目所示



未用印者無效

在保固期間內，提供維護與修繕服務，確保工程品質維持在良好狀態，將依據保固內容進行巡檢、維護或修復作業，提供相關技術協助，讓業主得以安心使用空間，確保後續使用的安全性與穩定性。



本案設計以「流動的曲線」為核心語彙，貫穿於整體空間之中，形成柔和而連續的主旋律。硬質材質在自然曲線的引導下，原本的剛性被巧妙柔化，展現出剛與柔的平衡之美。透過材質層次的變化，空間如同音符般跳動，時而高昂、時而低迴，彷彿一組律動的樂章在其中流淌，靜待時光與光影的交織，共譜自然之聲的第一樂章。





























